

नेपाल सरकार
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग
बबई सिंचाई आयोजना
बैदी, बर्दिया



आ.व. २०८२/८३, चौथो त्रैमासिक (२०८३ बैशाख, जेष्ठ, असार
महिना)को आयोजनाबाट सम्पादित कार्यको विवरण (सुचनाको हक
सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा (५) ३ को प्रयोजनको लागि):स्वतः
प्रकाशन

बबई सिंचाई आयोजना
बैदी, बर्दिया

१०५
सि० डि० ई०



नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिकहकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको जानकारी पाउने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त ऐनको दफा (५) ३ मा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो कार्यालयको सूचनाहरु प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बबई सिंचाई आयोजना बैदी बर्दियाले पनि यस्तो सूचनाहरु प्रकाशन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।

यो विवरणमा आ. व. ०८२/०८३, २०८३ बैशाख, जेष्ठ र असार महिनाको सूचना तथा अन्य विवरणहरु समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत विवरणले बबई सिंचाई आयोजना, बैदी, बर्दियाको काम, कारवाही सम्बन्धमा सर्वसाधारणमा सूचना प्रवाह हुने तथा सुधारको सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्राप्तहुने अपेक्षा लिएको छ । साथै सूचनामा सर्वसाधारण नागरिकहरुको हकको सुनिश्चतता प्रदान गर्न यस परियोजना कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

गोपाल शर्मा

आयोजना निर्देशक

१०५
सि. डि. ई.



१. परिचय

बबई सिंचाइ आयोजना, बर्दिया बबई नदीको पानी सिंचाइ प्रयोजनका लागि माटो, ढुंगा, झाला पाता, बाँसको माध्यमबाट नदीलाई फर्काएर परम्परागत रुपमा कृषकहरू आफैले दुःखका साथ चलाइरहेकोमा कृषकहरूलाई भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ २०४५ साल देखि सिंचाइ संरचना विकास तथा सुधारका काम क्रमिक रुपमा गर्दै आएकोमा आ.व. २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको छ। यस आयोजनाको उद्देश्य बर्दिया जिल्लाको बबई नदीको पूर्वतर्फ करिब २१००० हे. र पश्चिमतर्फ करिब १५००० हे. गरी जम्मा ३६००० हे. जमिनमा बाह्र महिना सिंचाइ सुविधा पुऱ्याई कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि गरी कृषकहरूको जीवनस्तर उकासी आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै देशमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" बनाउन टेवा पुऱ्याउने रहेको छ।

आयोजनाको खरिद तथा निर्माण कार्यलाई चुस्त बनाउनको निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम रु २,८३,३९,१६,०००.०० मा सकिनेगरी मिति २०६५/०२/१४ मा पहिलो खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुने, कार्यक्षेत्र विस्तार, कोरोनाको महामारी, भुकम्प, निर्माण कार्यको कार्य क्षेत्र तथा दायरा बढेको लगायतका कारणले आयोजना सम्पन्न हुने मितिका साथै आयोजनाको लागत समेत बढ्न गई आयोजनाको खरिद गुरुयोजनामा संशोधन भएको छ।

आ.व. हरू २०७९/८० र २०८०/८१ मा आयोजनाको स्वीकृत खरिद गुरु योजना अनुसार बजेट विनियोजन नभएको तथा संझौता भएको निर्माण कार्यमा समेत आयोजना तथा निर्माण व्यवसायीबाट आशातीत प्रगति प्राप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोजना सम्पन्न हुने अवधि धकेलिएको थियो।

आ.व. २०७७/७८ मा अद्यावधिक भएको गुरुयोजना अनुरूप सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएको र खरिद कार्य बाँकी नै रहेकाले आ.व. २०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको हुँदा विशेषतः पश्चिमी मूल नहरको चेनेज ३२+००० कि.मि. देखि चेनेज ४१+४०० कि.मि. सम्मको ९.४ कि.मि. खण्डको शाखा/उपशाखा तथा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यको खरिद प्रकृया गर्न बाँकि रहेको हुँदा आ.व. २०८२/८३ को असोज महिनामा खरिद गुरु योजना संशोधन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

पश्चिमी मूल नहरको चेनेज २८+००० कि.मि. देखि ३२+००० कि.मि. सम्म को मूल तथा शाखा नहरको निर्माण कार्य आ.व. २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी तथा चेनेज ३२+००० कि.मि. देखि ४१+४०० कि.मि. सम्मको मूल नहरको निर्माण कार्य आ.व. २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने गरी खरिद प्रकृयाको कार्य सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा रहेको छ।

सि. डि. ई.

पश्चिम मूल नहर अन्तर्गत चेनेज ३२+००० भन्दा प्रछाडिका सात शाखा नहरको (चौवुर्जी, तुलापुर, पदमपुर, थपुवा, घुम्नाहा, कालाबञ्जरा, बलेपूर्व र आशापुर) जग्गा अधिग्रहण अन्तरगत मुआब्जा निर्धारण भई बोलपत्र आह्वान भएको छ।

आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि खरिद प्रकृया सम्पन्न गरी यथासक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको निर्माण कार्य समेत समान्तर रूपमा अघि बढिरहेको हुँदा सो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म बबई सिँचाई आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएकाले खरिद तथा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गत आ.व. २०८१/८२ सम्मको प्रगति, चालु अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरू, बाँकी खरिद गर्नु पर्ने अद्यावधिक कार्यहरूको लागत अनुमान समेतको आधारमा अद्यावधिक लागत अनुमान तयार गरी कुल लागत रु.२६,६९,३३,१८,०००.०० को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा बबई सिँचाई आयोजनाको अद्यावधिक खरिद गुरुयोजना अवधि आ.व. २०८५/८६ सम्म प्रस्ताव गरिएकोमा मिति २०८२/०६/२८ मा स्वीकृत भएको छ।

त्यसैगरी आ.व. २०८२/८३ को असार मसान्तको समाप्ति सँगै आयोजनाको सिंचित क्षेत्र कुल ३६,००० हेक्टर मध्ये २८,८३० हेक्टर मा सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्य पुरा भएको छ।

आ.व. २०८२/८३ को असार महिनाको अन्त्यसम्ममा समग्रमा ८१.९७ % भौतिक प्रगति एवं ६८.२३ % वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ भने आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति ९९.८३ % भौतिक र ९८.१७ वित्तीय प्रगति रहेको छ।

१००
सि. डि. ई.

२. आयोजनाको बारेमा प्रमुख जानकारी



SALIENT FEATURES OF THE PROJECT

Name of the project	:	Babai Irrigation Project
Project Priority	:	National Pride
Location;		
Province	:	Lumbini
District	:	Bardiya
Hydrology of the Source		
Name of Water Source	:	Babai River
Catchment Area	:	3000 sq. km
High Flood Discharge	:	11000 Cumecs (100Yrs return Period)
HFL	:	192.78 m
Minimum Flow	:	5 Cumecs (Mid-April to Mid-July)
Meteorology		
Climates Zone	:	Sub-Tropical
Annual Rain fall	:	1328 mm (80% occurs during June to September)
Max. Temp	:	44 ⁰ c (June)
Min. Temp	:	5 ⁰ c (January)
Agro-Economy		
Average Land holding	:	0.84 ha
Majority of Population	:	60% either land less or hold about 0.5 ha of land in the area.
WUA Institution	:	Formal WUA after intervention of the project Secondary (SWUG) & Sub-secondary (SSWUG)
Economic Analysis		

Project Life	42 Yrs (2045 BS project started)
Investment Return	24 Yrs (2032 BS Study)
Per Hectare Cost	: NRs. 7,41,481/-
EIRR	: 22.8%
Cropping Intensity	: 169% (without Project)
	: 237% (Projected with project)
Elapsed Project Life	: 37 Years, F/Y 2081/82

Project Development(completed)

Head work	: 315 m-Weir cum Bridge act as East-West Highway Bridge over Babai River
Weir Crest	: 187.70 m
Under sluice	: 3 no. of bays (width=10m each)
Fish Ladder	: 1 no. on Eastern side of the Weir
Intake Head regulator	: 53 Cumecs (5 no. bays/ 2.5m m each)
Settling basin	: 63.0 Cumecs (source: H/W)
Length	: 980m
Flusing Capacity	: 20 m ³ /s
Bed width	: 20 m
Main Canal (East)	: 34.5 Km
Capacity	: 27.48 Cumecs.
Main Canal (West)	: 31.6 Km completed (9.8 km under construction)

Project Cost

Updated Master Plan	: 26,69,33,18,000/- with time extension, approval
Approved Master Plan	: NRs. 18,96,30,44,000.00 (Approved date 2078/01/21)
Capital Investment	: NRs. 18,21,41,26,000.00 (up-to 4 th quarter F/Y 2082/83)
Land Acquisition	: 394.55 ha. (up-to 4 th quarter F/Y 2082/83)



३. आ.व. २०८२/८३ को चौथो तथा बार्षिक त्रैमासिक सम्मको प्रमुख उपलब्धिहरु

यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

४. आयोजनामा देखिएका विद्यमान समस्या र समाधानका प्रयासहरु

यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

५. सेवा प्रदान गर्ने शाखाहरुको जिम्मेवार अधिकारीको टेलिफोन नम्बरहरु

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क नं.	कैफियत
१	गोपाल शर्मा	आयोजना निर्देशक	९८५११४६५९९	
२	दिनेश पौडेल	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर	९८५५०३०५७५	
३	निरज के.सी.	उप-सचिव (लेखा)	९८४९५३००५६	
४	शेखर नाथ न्यौपाने	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर (सूचना तथा सम्पर्क अधिकारी)	९८५८०६६५३६	
५	जित नारायण काशिछुवा	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर	९८५११५४८७७	
६	जिज्ञासा राई याङखुरुङ	सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर	९८४२१४९७४६	
७	किरण श्रेष्ठ	ईन्जिनियर	९८४२५२५५४९	
८	सुनिल कुमार कार्की	ईन्जिनियर	९८६३६२२३१३	
९	प्रतिक कडेल	ईन्जिनियर	९८४३५१०२७४	
१०	अनिश श्रेष्ठ	ईन्जिनियर	९८६०४२८४६६०	
११	सुरक्षा शर्मा	ईन्जिनियर	९८४२२७०९३९	
१३	सगुन अधिकारी	ईन्जिनियर	९८६०९००९६५	
१३	नमिता गौतम	ईन्जिनियर	९८६७७४२९३१	
१४	जितेन्द्र कुमार चौधरी	ईन्जिनियर	९८६२२३०१९२	
१५	प्रकाश पुन मगर	सब- ईन्जिनियर	९८६८९६८६१०	

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सम्पर्क नं.	कैफियत
१६	विकल विनोद चौधरी	सब- इन्जिनियर	९८५११६८२६	
१७	कुलानन्द चौधरी	सब- इन्जिनियर	९८५८४४०१२१	
१८	हरि बहादुर सुनार	सब- इन्जिनियर	९८५८४४४५५	
१९	दिपक के.सी.	सब- इन्जिनियर	९८५८०५५२७७	
२०	मनिष कुमार मण्डल	सब- इन्जिनियर	९७४२४९८५१८	
२१	निशान्त कुमार सिंह	सब- इन्जिनियर	९८१६८३४३६४	
२२	रामचन्द्र अवस्थी	सब- इन्जिनियर	९८६०१६४४९०	
२३	देवी बहादुर भण्डारी	नायव सुब्बा	९८६०३१४३०८	
२४	यदु प्रसाद पौडेल	लेखापाल	९८४८७४५७६५	

.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर

सेवा वापत दस्तुर नलाग्ने।

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि

आपतकालिन कामको लागि सामाग्री तथा बजेटको उपलब्धताको आधारमा यथाशीघ्र र अन्यको हकमा स्वीकृत खरिद गुरु योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा प्राविधिक पुष्ट्याई अनुसार।

निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार

प्रचलित कानून बमोजिम।

गुनासो सुन्ने अधिकारी

आयोजना निर्देशक श्री गोपाल शर्मा

सूचना अधिकारीको नाम

सि.डि.ई. श्री शेखर नाथ न्यौपाने

१८५
सि. डि. ई.

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग
बबई सिंचाई आयोजना
बैदी, बर्दिया



आ. व. २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको चौथो त्रैमासिक र वार्षिक एवं समष्टिगत प्रगति
विवरण

१. चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक भौतिक र वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन (detail excel sheet अनुसार प्रगति बनाएर राखिएको)

- चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति : ९८.८८%
- चौथो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति : १०२.२६%
- वार्षिक भौतिक प्रगति : ९९.८३%
- वार्षिक वित्तिय प्रगति : ९८.१७%

२. चौथो त्रैमासिक प्रगति ८०% भन्दा कम भएकोमा त्यसको कारण र समाधानका प्रयासहरु

- प्रगति ८०% भन्दा बढी भएको ।

३. उपलब्धि विवरण

आ.व.२०८२/८३ (चौथो त्रैमासिक) को उपलब्धि विवरण	इकाई	यस अवधिको उपलब्धी	चालु आ.व. को यस अवधिसम्मको उपलब्धी	शुरुदेखि हालसम्मको समष्टिगत उपलब्धी
सतह सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	६००	१५००	आयोजनाबाट कुल ३६००० हे. मध्ये हालसम्म हे. २८८३० सिंचित क्षेत्र विकास भएको
भूमिगत सिंचाई मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	-	-	-
नयाँ प्रविधि/लिफ्ट सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	-	-	-
FMIS मर्मत संभार/पुनर्स्थापना भएको	हेक्टर	-	-	-
तटबन्ध निर्माण	कि.मि.	०.९	२.१	३२.१४
जग्गा उकास	हेक्टर	-	-	-
पहिरो नियन्त्रण	वटा	-	-	-

१ म
सि. डि. ई.

४. कार्यान्वयन स्तरमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका प्रयासहरू



आयोजनामा देखिएका विद्यमान समस्या र समाधानका प्रयासहरू

समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
आयोजनाको हेडवर्क्स संचालन तथा व्यवस्थापनमा विद्युतीकरणको समस्या रहेको ।	हेडवर्क्स संचालनको लागि आवश्यक विद्युतीकरणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत सहजीकरणको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको र सो को ल.ई. को लागि गुलरिया स्थित विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको ।
आयोजनाको कार्यक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज तथा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भित्र परेकोले निर्माण कार्य/ नहर संचालनमा चुनौती रहेको। हाल कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको कारण NCB1 अन्तर्गतको १५० मि. नहर लाइनिंगको कार्य स्थगित भएको ।	बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज तथा कृष्णसार संरक्षणसंग समन्वय गरी हेडवर्क्स तथा नहरको संचालन र मर्मत सम्भारको कार्य गर्ने गरिएको । हाल Environmental Management Plan (EMP) संसोधनको लागी पेश गरिएको, उक्त संसोधन पश्चात जग्गा प्राप्त गरी निर्माण कार्य गर्नु पर्नेमा उक्त ठेक्काको अन्य काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले, EMP संसोधनको प्रकृया छिटो टुंगिनु जरुरी रहेको ।
स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा विस्तृत आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनामा तोकिए अनुसारको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न जनशक्ति अभाव ।	दरबन्दी थप गर्नु पर्ने तथा सो अनुसारको आवास तथा सवारी साधन लगायतको व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको ।
नदी जन्य निर्माण सामाग्रीको अभाव	वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ / निर्माण सामाग्री को उत्खननमा सहजीकरण/सम्बोधन आवश्यक रहेको ।

५. MDAC बैठकमा राखिनु पर्ने ISSUE हरू

- हेडवर्क्स संचालनको लागि आवश्यक विद्युतीकरण गर्ने स्वीकृती प्रदान गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
- बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र रहेको हेडवर्क्स तथा नहर संचालन र मर्मत सम्भार कार्यका लागि निकुन्ज प्रशासनलाई सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिनुपर्ने ।
- वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ / निर्माण सामाग्री को उत्खननमा स्थानिय स्तरमा सहजीकरण तथा राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन आवश्यक रहेको ।
- आयोजनालाई अगामी २ बर्षमा सम्पन्न गर्नको लागी थप दरबन्दी स्वीकृत गरी परिचालन गरिनुपर्ने साथै थप आवास तथा सवारी साधन लगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

सि. डि. ई.

चौथो त्रैमासिक र वार्षिक प्रति विवरण

७. यस अवधिसम्मको खर्च :- २४०१६.३६
क. आन्तरिक २४०१६.३६

ख. वैदेशिक

८. चालु आ.ब.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिगत :- २४०१६.३६ ९८.१७
९. कुल लागत मध्ये शुरु देखि यस अवधिको कुल खर्च रकम र प्रतिगत :- १८२१४१.२६ ६८.२२
१०. आयोजनाको मुहूर्तदेखि यस अवधी सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिगत :- ८१.९७
११. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये बितेको समय प्रतिशतमा :- ९२.६८

७६२८.०२
मुद्रागत ७४३०.०० ९८.०२

१. आ.ब. २०८२/८३
२. बजेट उपवर्गिक नं. : ३०८०३११२
३. मन्त्रालय : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
४. कार्यक्रम/आयोजना : बजेट सिंचाइ आयोजना/अर्द्धा
५. आयोजना प्रमुखको नाम : श्री गोपाल शर्मा
६. यस अवधिको बजेट रु. लाखमा

क) आन्तरिक
(१) नेपाल सरकार (पुर्तिगत र चालु)

(२) संस्था

(३) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

(१) ऋण

(२) अनुदान

ग) बाँकी संस्था

र.लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक लागत			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिविवरण अवधिसम्मको प्रगति			सूचकांक आधारमा प्रमुख	
				परिशिष्ट	भार	बजेट	परिशिष्ट	भार	बजेट	खर्च	परिशिष्ट	भार	बजेट	परिशिष्ट	भार	परिशिष्ट	भार
अ	पुर्तिगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू																
१	११.५.१५.४४	३११७१	प्र.श.	१०	०.०६	१५.०	२.००	०.०१	७.०	०.०१२	२.००	०.०१	५.००	०.०५	९.८८	९०.३६	०.१३
२	११.५.२८.१५.४४	३११७५	प्र.श.	२	०.०१	२.३	१.००	०.००५	१.०	१.००	०.००५	१.२६	२.००	०.०१	२.३४	६९.५६	०.०१
३	११.५.२८.१५.४०	संख्या	संख्या	१.६	०.०५	१२.७	०.२०	०.०१	०.१	०.६०	०.०१९	०.००	१.४०	०.०५	६.९८	९४.९१	०.३१
४	११.५.१५.४१	३११५५	कि. मि.	१०.००	०.४१	१००.००	१.००	०.०४	-	०.००	०.०००	०.००	१०.००	०.४१	१००.००	७८.६०	०.८९
५	११.५.१५.४९	३११५५	प्र.श.	१०	०.२९	७०.०	०.००	०.००	०.०	३.००	०.०८६	८.७९	१०.००	०.२९	८५.९८	०.१८	
६	११.५.१५.१३५९	३११५५	कि. मि.	२.६००	१०.७१	२६२०.०	०.३०	१.२४	६२०.०	०.९०	३.७०७	८.६५	२.१०	८.६५	२.४३५.३७	३२.१४	१०.११
७	११.५.१५.३११	३११५५	हेक्टर	१५००	३३.०३	८०८०.०	६००.००	१३.२१	३५८०.०	६००.००	१३.२११	४३२६.९०	१.५००	३३.०३	८०६४.७९	२८.८३०.००	१८.९२
८	११.५.१५.४६०	३११५५	कि. मि.	६.०००	३२.५४	७९६०.०	२.००	१०.८५	१३६०.०	२.००	१०.८५५	१४१६.३२	६.००	३२.५४	७९४९.६०	७२.१०	१७.५६
९	११.५.१५.४६१	३११५५	कि. मि.	१०.००	१.२३	३००.००	४.००	०.४९	६०.००	४.००	०.४९०	०.००	१०.००	१.२३	३००.००	२१.४७	१.१९
१०	११.५.१५.४६२	३११५५	कि. मि.	१२.५	१२.३०	३०१०.०	४.००	३.९४	१८१६.०	२.००	१.९६९	९५५.३५	१६.००	१५.७५	२९४५.३५	३३७.४८	२०.९८
११	११.५.१५.४१	३११७१	प्र.श.	१५	२.०४	५००.०	२.००	०.२७	६०.०	२.००	०.२७२	०.९५	१५.००	२.०४	४९१.५३	६४.२५	१.०९
१२	११.५.१५.४२	३११७१	प्र.श.	१०.०००	१.२४	३०४.०	१.००	०.१२	२४.९	४.००	०.४९७	१००.६१	१०.००	१.२४	३००.०८	७०.८७	०.९३
१३	११.२.२.७	३११७१	हेक्टर	११	४.५०	११००.०	३.६०	१.४७	०.०	०.६०	०.२४५	६८.४८	७.७६	३.१७	१.०६३.७०	३९४.५५	५.६३
	(क)				९८.४०	२४०७४.००		३१.६५	७४३०.००		३१.३६	७७२०.४९		९८.४४	२३६७८.३३		८०.६७
	(ख)				१.६०	३९१.२०		०.३६	९८.०२		०.२९	८०.१५		१.३८	३३८.०३		१.३१
	(ग)				१००.००	२४४६५.२०		३२.०१	७६२८.०२		३१.६५	७८००.६४		९९.८३	२४०१६.३६		८१.९७

१८.८८ *
१०२.२६ *


वार्षिक भौतिक प्रगति :
वार्षिक वित्तिय प्रगति :

१०२
सि० डि० ६०

निर्माण कार्य सम्पादन सम्बन्धी तस्विरहरु




ग्याबिनको प्रयोग गरी तटबन्ध निर्माण / सिंचित क्षेत्र संरक्षण कार्य

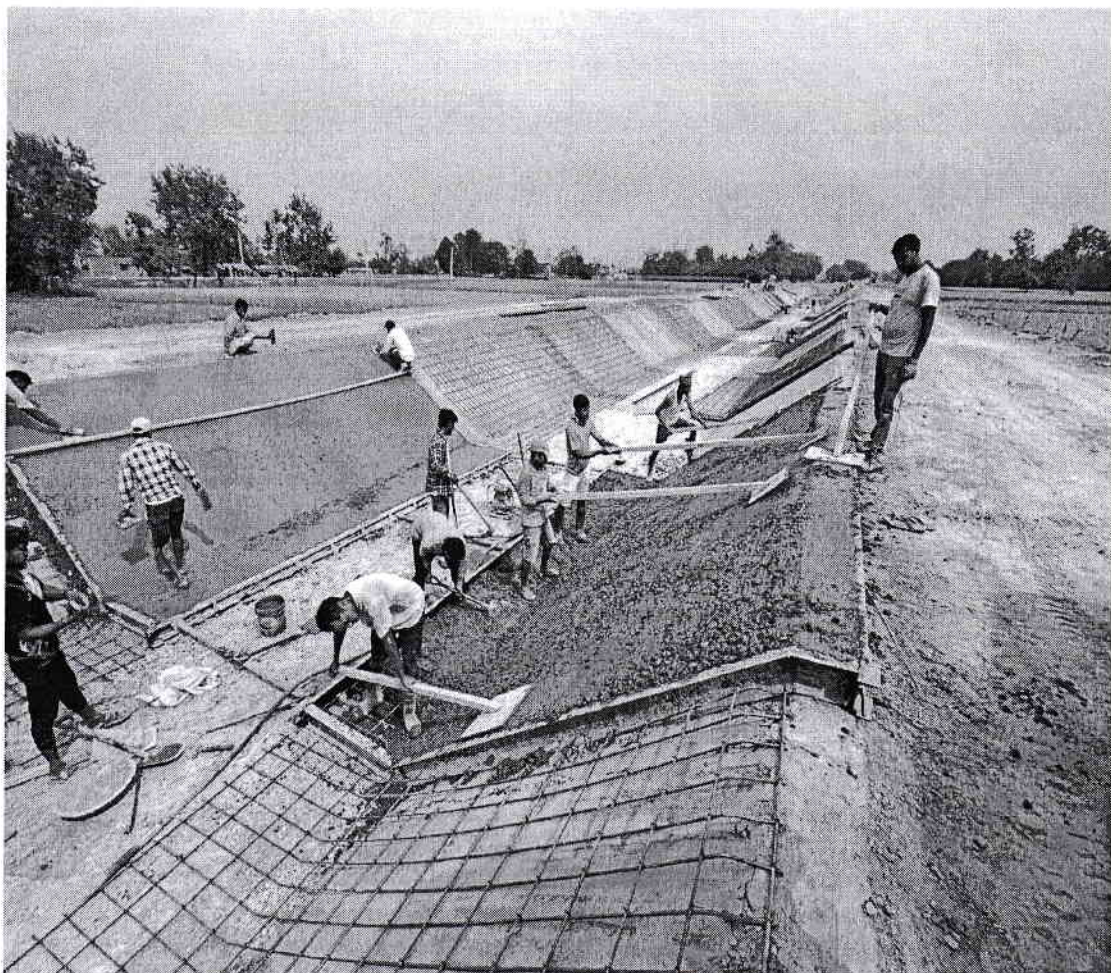

पश्चिम मूल नहर अन्तर्गतको Slope Lining

सि. डि. ३०

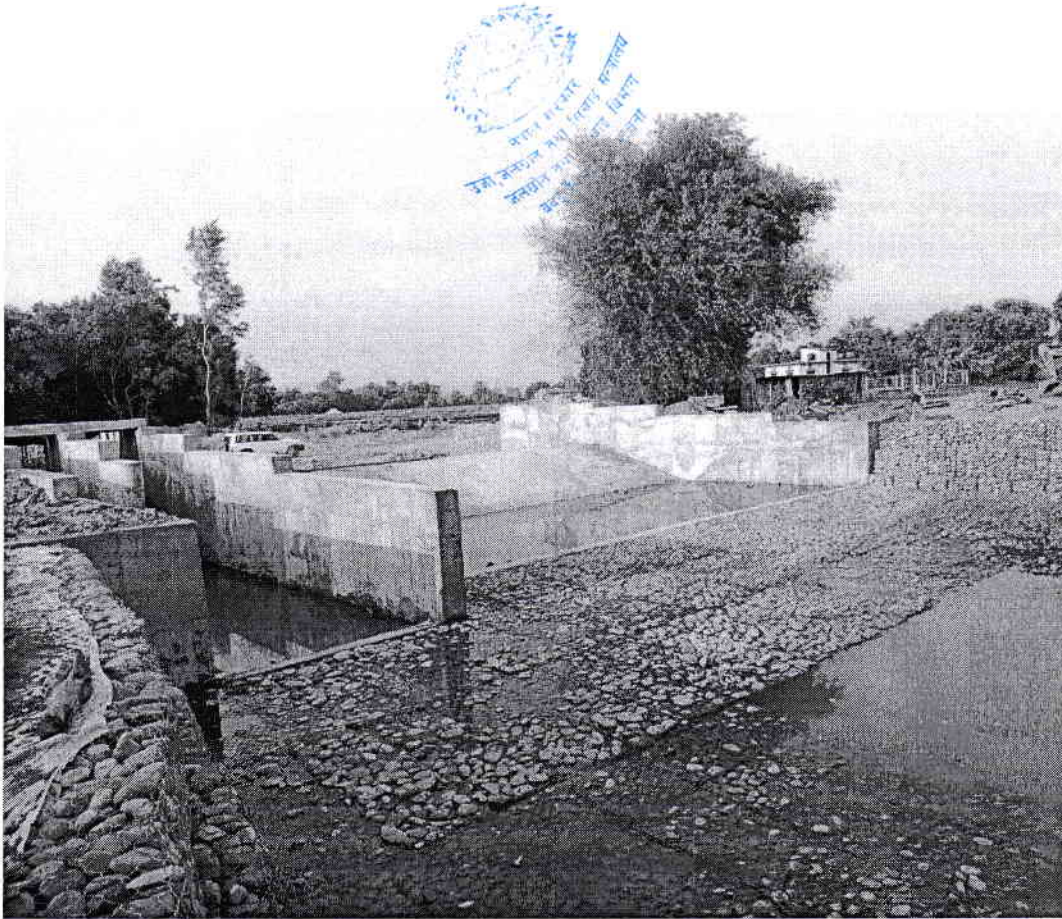


पूर्वी नहर प्रणाली अन्तर्गत S1 शाखा नहर अन्तर्गतको सिम्रहवा बाँध




पश्चिमी मूल नहर (चे.२८+०००), पर्वतीया मन्दिर नजिक निर्माणाधिन साईफन

राम
म. डि. ई.

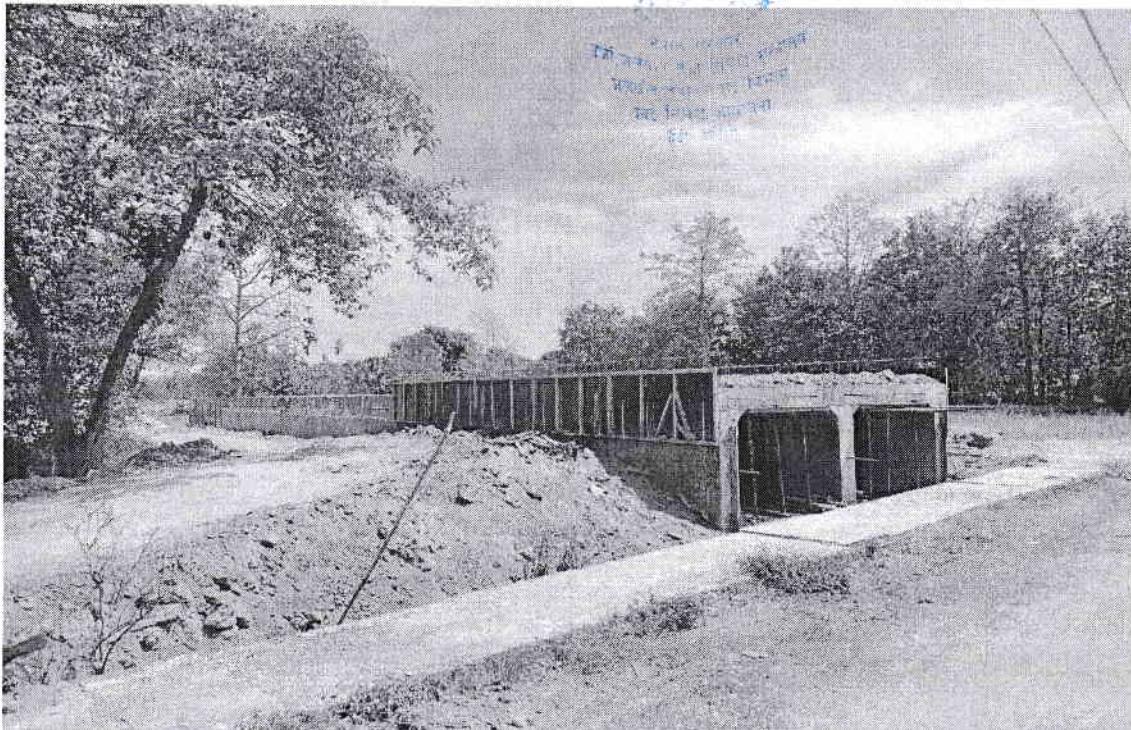

पश्चिम मूल नहर (चे.२९+४००) अन्तर्गतको निर्माणाधिन कभर्ड क्यानल

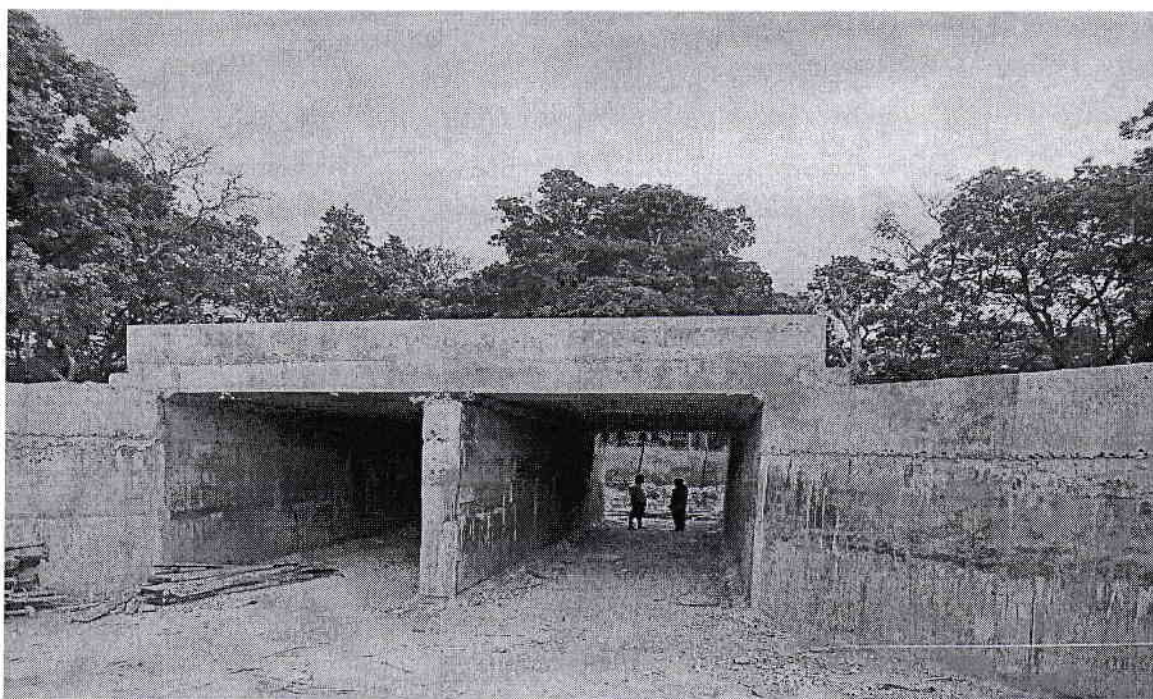

पश्चिम नहर प्रणाली अन्तर्गत उत्तर कुलोको SR1(चे.०+४००) निर्माणाधिन Drain Under Pass

१०५
सि. डि. ई.
