

१. आ.ब. २०८२/८३

२. बजेट उपसर्गिक नं. : २०८०३११२

३. मन्त्रालय : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय/जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

४. कार्यक्रम/आयोजना : बजेट सिंचाइ आयोजना/अर्धिया

५. आयोजना प्रमुखको नाम : श्री गोपाल शर्मा

६. यस अवधिको बजेट रु. लाखमा

क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार (पुनर्गत र चालु)

(२) संस्था

(३) जनसहभागिता

ख) वैदेशिक

(१) ऋण

(२) अनुदान

ग) बाह्य स्रोत



नेपाल सरकार
जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
बजेट सिंचाइ आयोजना
कोशी, बर्दिया

कोषो त्रैमासिक र वार्षिक प्रति विवरण

७. यस अवधिस्मको खर्च :-

२४०१६.३६

क) आन्तरिक

२४०१६.३६

ख) वैदेशिक

७६२८.०२

पुनर्गत चालु

७४३०.०० ९८.०२

८. चालु आ.ब.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-

२४०१६.३६ ९८.१७

९. कुल लागत मध्ये शुरू देखि यस अवधिको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :-

१८२१४१.३६ ६८.२३

१०. आयोजनाको पुरोदेखि यस अवधी सम्मको मौलिक प्रगती प्रतिशत :-

८१.९७

११. आयोजनाको कुल खर्चि मध्ये बित्तिको समय प्रतिशतमा :-

९२.६८

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			कोषो त्रैमासिक लक्ष्य			कोषो त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिस्मको प्रगति			सूचकको आधारमा प्रत्यक्ष	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार
१	संस्थागत विकास (भवन निर्माण तथा मर्मत, कृषक तालिम, अवलोकन भ्रमण, समता अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि)	प्र.श.	१०	०.०६	१५.०	२.००	०.०१	७.०	२.००	०.०१२	०.४७	८.००	०.०५	९.८८	९०.३६	०.१३
२	(कृषि व्यवस्थापिकरण/ विस्तार कार्यक्रम (विउ उत्पादन तथा भाडुर डिग्री, मेलिन/ अनाज बिक्रि तथा भाडा, तालिम, मल, बिउ, क्विटनायक वितरण/मर्दान, एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम आदि))।बाली उत्पादन सर्वेक्षण।	प्र.श.	२	०.०१	२.३	१.००	०.००५	१.०	१.००	०.००५	१.२६	२.००	०.०१	२.३४	६९.५६	०.०१
३	नदी तथा सिंचाइ प्रणालीको विस्तृत सर्वेक्षण/ समभाव्यता अध्ययन, House Hold Survey, Arbitration Service, जस्तादन तथा जलवायवीय प्रभाव अध्ययन र निर्माण कार्यको रविवेध, निरीक्षण तथा गाममा निरुन्धन कार्य	संख्या	१.६	०.०५	१२.७	०.२०	०.०१	०.१	०.६०	०.०१९	०.००	१.४०	०.०५	६.९८	९४.९१	०.३१
४	तालिम रोड	कि. मि.	१०.००	०.४१	१००.००	१.००	०.०४	-	०.००	०.०००	०.००	१०.००	०.४१	१००.००	७८.६०	०.८९
५	बातावरण संरक्षण कार्यक्रम (वृक्षारोपण, फेन्सिंग, संरक्षण कार्य, आदि)	प्र.श.	१०	०.२९	७०.०	०.००	०.००	०.०	३.००	०.०८६	८.७९	१०.००	०.२९	८.७९	६५.९८	०.१८
६	सिंचित क्षेत्र तथा संरचना संरक्षण कार्य	कि. मि.	२.६००	१०.७१	२६२०.०	०.३०	१.२४	६२०.०	०.९०	३.७०७	८४१.३७	२.१०	८.६५	२.४३५.३७	३२.१४	१०.११
७	सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्य	हेक्टर	१५००	३३.०३	८०८०.०	६००.००	१३.२१	३५८०.०	६००.००	१३.२११	४३२६.९०	१.४००	३३.०३	८०६४.७२	२८.८३०.००	१८.९२
८	मूलभूत निर्माण कार्य (मूलभूतको संरचना निर्माण समेत)	कि. मि.	६.०००	३२.५४	७९६०.०	२.००	१०.८५	१३६०.०	२.००	१०.८५५	१४१६.३२	६.००	३२.५४	७.९४९.६०	७३.१०	१७.५६
९	ड्रेनेज निर्माण/व्यवस्थापन कार्य (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण। ड्रेनेज निर्माण तथा व्यवस्थापन)	कि. मि.	१०.००	१.२३	३००.००	४.००	०.४९	६०.००	४.००	०.४९०	०.००	१०.००	१.२३	३००.००	२१.४७	१.१९
१०	शाखा/उपशाखा नहर निर्माण कार्य (शाखा/उपशाखा नहरको संरचना निर्माण समेत)	कि. मि.	१२.५	१२.३०	३०१०.०	४.००	३.९४	१८१६.०	२.००	१.९६९	९५५.३५	१६.००	१५.७५	२.९४५.३५	३३७.४८	२०.९८
११	नहर/संरचना मर्मत सम्भार कार्य (सिंचाइ/मल/मलको मर्मत समेत)	प्र.श.	१५	२.०४	५००.०	२.००	०.२७	६०.०	२.००	०.२७२	०.९५	१५.००	२.०४	४९१.५३	६४.९५	१.०९
१२	नहर संरचना, जलमापन तथा गेज निर्माण	प्र.श.	१०.०००	१.२४	३०४०.०	१.००	०.१२	२५.९	४.००	०.४९७	१००.६१	१०.००	१.२४	३००.०८	७०.८७	०.९३
१३	जग्गा अधिग्रहण/नहर निर्माणको लागि जग्गा खरिद)	हेक्टर	११	४.५०	११००.०	३.६०	१.४७	०.०	०.६०	०.२४५	६८.४८	७.७६	३.१७	१.०६३.७०	३९४.५५	५.६३
	(क) पुर्णित खर्च तर्फ जम्मा			९८.४०	२४७७.००		३१.६५	७५३०.००		३१.३६	७७९०.४९		९८.४४	२३६७८.३३		८०.६७
	(ख) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु			१.६०	३९१.२०		०.३६	९८.०२		०.२९	८०.१५		१.३८	३३८.०३		१.३१
	(ग) कुल जम्मा खर्च (क+ख)			१००.००	२४४६५.२०		३२.०१	७६२८.०२		३१.६५	७८००.६४		९९.८३	२४०१६.३६		८१.९७

कोषो त्रैमासिक प्रतिशत प्रतिशत

९८.८८ x

१०२.२६ x

वार्षिक मौलिक प्रगति :

९९.८३ x

९८.१७ x

वार्षिक वित्तिय प्रगति :

९९.८३ x

९८.१७ x

निमित्त आयोजना निर्देशक

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग
बबई सिंचाई आयोजना
बैदी, बर्दिया



आ. व. २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको चौथो त्रैमासिक र वार्षिक एवं समष्टिगत प्रगति विवरण

१. चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन (detail excel sheet अनुसार प्रगति बनाएर राखिएको)

- चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति : ९८.८८%
- चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति : १०२.२६%
- वार्षिक भौतिक प्रगति : ९९.८३%
- वार्षिक वित्तीय प्रगति : ९८.१७%

२. चौथो त्रैमासिक प्रगति ८०% भन्दा कम भएकोमा त्यसको कारण र समाधानका प्रयासहरू

- प्रगति ८०% भन्दा बढी भएको ।

३. उपलब्धि विवरण

आ.व.२०८२/८३ (चौथो त्रैमासिक) को उपलब्धि विवरण	इकाई	यस अवधिको उपलब्धि	चालु आ.व. को यस अवधिसम्मको उपलब्धि	शुरुदेखि हालसम्मको समष्टिगत उपलब्धि
सतह सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	६००	१५००	आयोजनाबाट कुल ३६००० हे. मध्ये हालसम्म हे. २८८३० सिंचित क्षेत्र विकास भएको
भूमिगत सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	-	-	-
नयाँ प्रविधि/लिफ्ट सिंचाइ मार्फत सिंचित क्षेत्र बढेको	हेक्टर	-	-	-
FMIS मर्मत संभार/पुनर्स्थापना भएको	हेक्टर	-	-	-
तटबन्ध निर्माण	कि.मि.	०.९	२.१	३२.१४
जग्गा उकास	हेक्टर	-	-	-
पहिरो नियन्त्रण	वटा	-	-	-

(Signature)

निमित्त आ. निर्देशक

४. कार्यान्वयन स्तरमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका प्रयासहरू



आयोजनामा देखिएका विद्यमान समस्या र समाधानका प्रयासहरू

समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
आयोजनाको हेडवर्क्स संचालन तथा व्यवस्थापनमा विद्युतीकरणको समस्या रहेको ।	हेडवर्क्स संचालनको लागि आवश्यक विद्युतीकरणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत सहजीकरणको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको र सो को ल.ई. को लागि गुलरिया स्थित विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको ।
आयोजनाको कार्यक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज तथा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भित्र परेकोले निर्माण कार्य/ नहर संचालनमा चुनौती रहेको। हाल कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको कारण NCB1 अन्तर्गतको १५० मि. नहर लाइनिंगको कार्य स्थगित भएको ।	बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज तथा कृष्णसार संरक्षणसंग समन्वय गरी हेडवर्क्स तथा नहरको संचालन र मर्मत सम्भारको कार्य गर्ने गरिएको । हाल Environmental Management Plan (EMP) संसोधनको लागी पेश गरिएको, उक्त संसोधन पश्चात जग्गा प्राप्त गरी निर्माण कार्य गर्नु पर्नेमा उक्त ठेक्काको अन्य काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले, EMP संसोधनको प्रकृया छिटो टुंगिनु जरुरी रहेको ।
स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा विस्तृत आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनामा तोकिए अनुसारको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न जनशक्ति अभाव ।	दरबन्दी थप गर्नु पर्ने तथा सो अनुसारको आवास तथा सवारी साधन लगायतको व्यवस्था हुनु जरुरी रहेको ।
नदी जन्य निर्माण सामाग्रीको अभाव	वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ / निर्माण सामाग्री को उत्खननमा सहजीकरण/सम्बोधन आवश्यक रहेको ।

५. MDAC बैठकमा राखिनु पर्ने ISSUE हरू

- हेडवर्क्स संचालनको लागि आवश्यक विद्युतीकरण गर्ने स्वीकृती प्रदान गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।
- बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र रहेको हेडवर्क्स तथा नहर संचालन र मर्मत सम्भार कार्यका लागि निकुन्ज प्रशासनलाई सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिनुपर्ने ।
- वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ / निर्माण सामाग्री को उत्खननमा स्थानिय स्तरमा सहजीकरण तथा राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन आवश्यक रहेको ।
- आयोजनालाई अगामी २ वर्षमा सम्पन्न गर्नको लागी थप दरबन्दी स्वीकृत गरी परिचालन गरिनुपर्ने साथै थप आवास तथा सवारी साधन लगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

निमित्त आयोजना निर्देशक

निर्माण कार्य सम्पादन सम्बन्धी तस्विरहरु

नेपाल सरकार
जल, प्रशस्त तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलसिंचन तथा सिंचाइ विभाग
बुटवल सिंचाइ आयोजना
बैतडी जिल्ला



ग्याबिनको प्रयोग गरी तटबन्ध निर्माण / सिंचित क्षेत्र संरक्षण कार्य



पश्चिम मूल नहर अन्तर्गतको Slope Lining



पूर्वी नहर प्रणाली अन्तर्गत S1 शाखा नहर अन्तर्गतको सिम्रहवा बाँध




पश्चिमी मूल नहर (चे. २८+०००), पर्वतीया मन्दिर नजिक निर्माणाधिन साईफन

8

निमित्त आयोजना निर्देशक



पश्चिम मूल नहर (चे.२९+४००) अन्तर्गतको निर्माणाधिन कभर्ड क्यानल

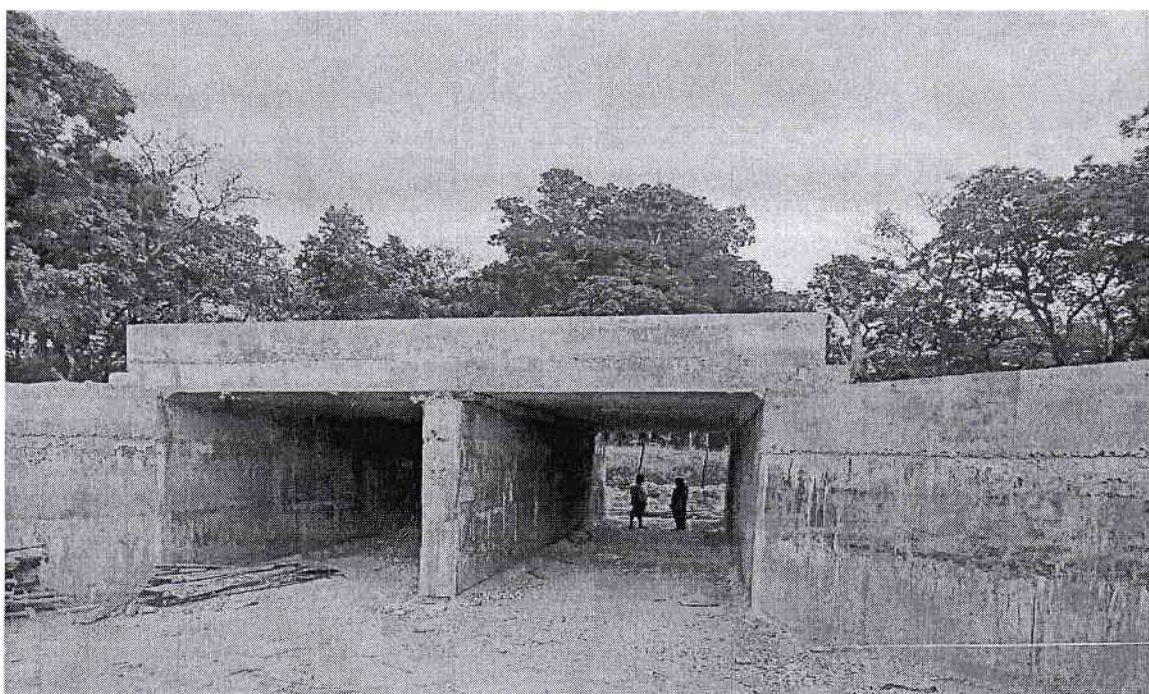

पश्चिम नहर प्रणाली अन्तर्गत उत्तर कुलोको SR1(चे.०+४००) निर्माणाधिन Drain Under Pass

8

निमित्त आयोजना निर्देशक
